



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53
DESP - Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

MEDIÇÃO Nº 02

Folha nº

CONTRATADA: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFUNÇÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM

Data de Emissão: 05/09/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2023 a 04/08/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MIO
PRO ESARJETA

Contrato de Programa nº 46/2023

Dispensa nº - 11/2023

Valor C/T/A
R\$ 1.690.426,45

Saldo Anterior
R\$ 1.519.621,93

Era medido:
R\$ 151.820,05

Saldo:
R\$ 1.367.801,88

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	Saldo	
			Anterior	No Período	Acumulado				No Período
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 6.402,43	R\$ 19.566,43	
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIÇADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA	4,50	4,50	0,00	4,50	M2	310,95	0,00	1.399,28
1.2	ENCARREGADO DE OBRA	120,00	20,00	18,00	38,00	DIA	266,25	4.792,50	10.117,50
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2,00%	0,00	0,40%	0,50%	%	1.609.929,95	1.609,93	8.049,65
2	PREPARAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO DE TERRA		0,00	0,00					
2.1	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CASCALHO								
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO								
2.3	BASE DE SOLO - S/ TRANSPORTE E CARREGAMENTO (ROLO PE DE CARNEIRO, PATROL, PIPA E TRATOR GRADE)								
3	TSD COM CAPA SELANTE			0,00				0,00	0,00
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,69	0,00	0,00
3.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLIO	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	4,28	0,00	0,00
3.3	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EMI	11,65	0,00	0,00	-	TON	4.113,74	0,00	0,00
3.4	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	33,99	0,00	0,00	-	TON	5.554,78	0,00	0,00
3.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 1 - SEM FRETE	194,20	0,00	0,00	-	TON	78,38	0,00	0,00
3.6	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	97,10	0,00	0,00	-	TON	82,64	0,00	0,00
3.7	FORNECIMENTO DE AGREGADO AREIA - COM FRETE	48,55	0,00	0,00	-	TON	178,92	0,00	0,00
3.9	TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA 1	69.912,00	0,00	0,00	-	TONNKM	0,45	0,00	0,00
3.10	TRANSPORTE AGREGADO - BRITA 0	34.956,00	0,00	0,00	-	TONNKM	0,45	0,00	0,00
3.11	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLIO (TSD)	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,82	0,00	0,00
3.12	BANHO DILUÍDO PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL	9.710,00	0,00	0,00	-	M2	0,53	0,00	0,00
3.13	LAVAGEM DE BRITA EM CAMINHÃO	436,95	0,00	0,00	-	M3	5,95	0,00	0,00

Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5

A CARGO DO MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais (NPJ): 18.303.164/0001-53
DESP - Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

MEDIÇÃO Nº 02

Folha nº:

CONTRATADA: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIMUNICIPAL DO VALE DO JERQUINHONHA - CIM

Data de Emissão: 05/09/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2023 a 04/08/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MEIO FIO E SAREJETA

Contrato de Programa nº 46/2023

Dispensa nº 11/2023

Valor C/DTA

Saldo Anterior

Esta medição:

Saldo:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS		Acumulado	UNID.	VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS R\$	
			Anterior	No Período				No Período	Acumulado
5.14	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	9710,00	0,00	0,00	-	M2	0,53	0,00	0,00
4	EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO CAMADA DUPLA 2,8CM							0,00	0,00
4.1	CARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - MECÂNICA	129,60	0,00	0,00	-	M3	3,11	0,00	0,00
4.2	MICROREVESTIMENTO (CAMADA 1 - 2,0 CM)	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	2,47	0,00	0,00
4.3	MICROREVESTIMENTO (CAMADA 2 - 0,8 CM)	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	1,90	0,00	0,00
4.4	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	58,32	0,00	0,00	-	T	82,64	0,00	0,00
4.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO PÓ DE PEDRA - SEM FRETE	136,08	0,00	0,00	-	T	66,35	0,00	0,00
4.6	FORNECIMENTO DE FILLER PARA MRAF (CAL HIDRATADA)	97,20	0,00	0,00	-	UNID	22,24	0,00	0,00
4.7	FORNECIMENTO DE EMULÇÃO ASFALTICA PARA EXECUÇÃO DE MRAF (RC-1C-E)	24,00	0,00	0,00	-	T	6.110,28	0,00	0,00
4.8	TRANSPORTE COMERCIAL DE PÓ DE PEDRA	48.988,80	0,00	0,00	-	TKKM	0,45	0,00	0,00
4.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 0	20.995,20	0,00	0,00	-	TKKM	0,45	0,00	0,00
4.10	LIMPEZA DE VIA NIVEL 1 - CAMINHÃO PIPA	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	1,66	0,00	0,00
4.11	LIMPEZA DE VIA NIVEL 2 - LIMPEZA MANUAL	4.800,00	0,00	0,00	-	M2	2,88	0,00	0,00
5	DRENAGEM SUPERFICIAL							143.807,70	299.838,30
5.1	MEIO-FIO A EXECUTADO CENTRUSORA (MEIO-FIO 15X10CM X H-23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO DE FAIXA 0,45M	12948,00	2.068,00	1.906,00	3.974,00	M	35,98	68.577,88	142.984,52
5.2	SAREJETA DE CONCRETO URBANO TIPO 1 FCK 15MPA LARGURA 30CM ESP 7CM	12948,00	2.068,00	1.906,00	3.974,00	M	39,47	75.229,82	156.853,78
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 1.609,93	R\$ 3.219,86
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	3,00%	0,10%	0,10%	0,20%	%	1.609,929,95	1.609,93	3.219,86
TOTAL GERAL								R\$ 151.820,05	R\$ 322.624,58

Observação: MEIO FIO E SAREJETA FAZENDA DA PONTE

Contratante:	Fiscalização/Prefeitura	Contratada:	Engº Responsável Técnico CREA:	Fator de Reajust	Total s/ reajust
Assinatura do Prefeito	Assinatura do Responsável	Assinatura do Responsável	Assinatura do Engenheiro Responsável	Total s/ reajust	Total s/ reajust
					Imposta a presente medição em R\$
					R\$ 151.820,05

Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
AVENIDA JOSÉ MADUFEIRA HORTA Nº 190 CENTRO
CEP 39140000 email – contato@alvoradademinas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS– MG

CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA
EXECUÇÃO DE OBRAS EM TSD, MICRO REVESTIMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Contratada: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha.
Processo licitatório: 54/2023
Modalidade dispensa de licitação: 11/2023
Contrato de programa: 46/2023
Valor da obra: 1. 690.426,45
Ordem de Serviço: 08/2023
Prazo: 31/12/2023
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos.

CONTINUAÇÃO MEIO FIO E SARJETA RUA BANDEIRINHA

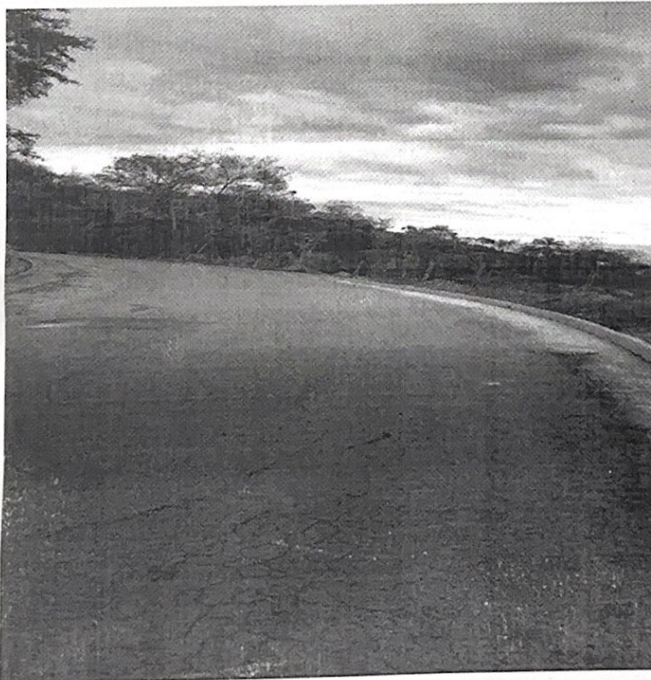


Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5

IMAGEM 01: meio fio e sarjeta Bandeirinha

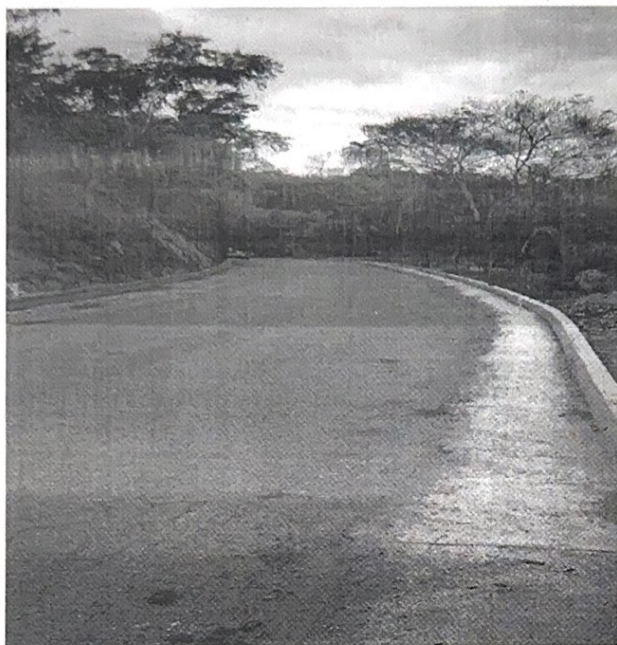


IMAGEM 02: meio fio e sarjeta Bandeirinha



IMAGEM 03: meio fio e sarjeta Bandeirinha


Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5



IMAGEM 04: meio fio e sarjeta Bandeirinha


Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5
