



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG
CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO À MG-010

REV_01
01/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS										
			1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL		
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO													
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 152.321,06	0,99%	%	50,00%							50,00%	100,00%
				G									
				R\$	R\$76.160,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$76.160,53
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 462.673,91	3,01%	%	5,46%	11,40%	15,18%	15,10%	14,81%	15,16%	14,95%	7,94%	100,00%
				G									
				R\$	R\$25.262,00	R\$52.744,83	R\$70.233,90	R\$69.863,76	R\$68.522,01	R\$70.141,36	R\$69.169,75	R\$36.736,31	R\$462.673,91
3 SERVIÇOS INICIAIS													
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.682,51	0,01%	%	100,00%								100,00%
				G									
				R\$	R\$1.682,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.682,51
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 53.300,29	0,35%	%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
				G									
				R\$	R\$6.662,54	R\$6.662,54	R\$6.662,54	R\$6.662,54	R\$6.662,54	R\$6.662,54	R\$6.662,54	R\$6.662,54	R\$53.300,29
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 191.820,32	1,25%	%	33,34%		33,33%		33,33%				100,00%
				G									
				R\$	R\$63.952,89	R\$0,00	R\$63.933,71	R\$0,00	R\$63.933,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$191.820,32
3.4	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 18.113,32	0,12%	%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
				G									
				R\$	R\$2.264,17	R\$2.264,17	R\$2.264,17	R\$2.264,17	R\$2.264,17	R\$2.264,17	R\$2.264,17	R\$2.264,17	R\$18.113,32
4 PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO À MG-010													
4.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	R\$ 612.112,49	3,98%	%	30,00%	35,00%	35,00%						100,00%
				G									

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG
CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO À MG-010

REV_01
01/07/2024


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS									
				1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	
				R\$	R\$183.633,75	R\$214.239,37	R\$214.239,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$612.112,49
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.509.063,32	16,31%	%	20,00%	25,00%	35,00%	20,00%					100,00%
				G									
				R\$	R\$501.812,66	R\$627.265,83	R\$878.172,16	R\$501.812,66	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.509.063,32
4.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	R\$ 2.057.494,06	13,37%	%		15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%			100,00%
				G									
				R\$	R\$0,00	R\$308.624,11	R\$514.373,52	R\$514.373,52	R\$411.498,81	R\$308.624,11	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.057.494,06
4.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 8.797.616,85	57,19%	%		6,00%	7,00%	14,00%	20,00%	22,00%	25,00%	6,00%	100,00%
				G									
				R\$	R\$0,00	R\$527.857,01	R\$615.833,18	R\$1.231.666,36	R\$1.759.523,37	R\$1.935.475,71	R\$2.199.404,21	R\$527.857,01	R\$8.797.616,85
4.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 525.413,31	3,42%	%								100,00%	100,00%
				G									
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$525.413,31	R\$525.413,31
4.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.816,40	0,02%	%								100,00%	100,00%
				G									
				R\$	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.816,40	R\$2.816,40
TOTAL		R\$15.384.427,84	100,00%	R\$	R\$861.431,04	R\$1.739.657,85	R\$2.365.712,54	R\$2.326.643,00	R\$2.312.404,60	R\$2.323.167,88	R\$2.277.500,66	R\$1.177.910,26	R\$15.384.427,84
TOTAL ACUMULADO				R\$	R\$861.431,04	R\$2.601.088,89	R\$4.966.801,43	R\$7.293.444,43	R\$9.605.849,03	R\$11.929.016,92	R\$14.206.517,58	R\$15.384.427,84	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG
CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO À MG-010

REV_01
01/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS							
			1	2	3	4	5	6	7	8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

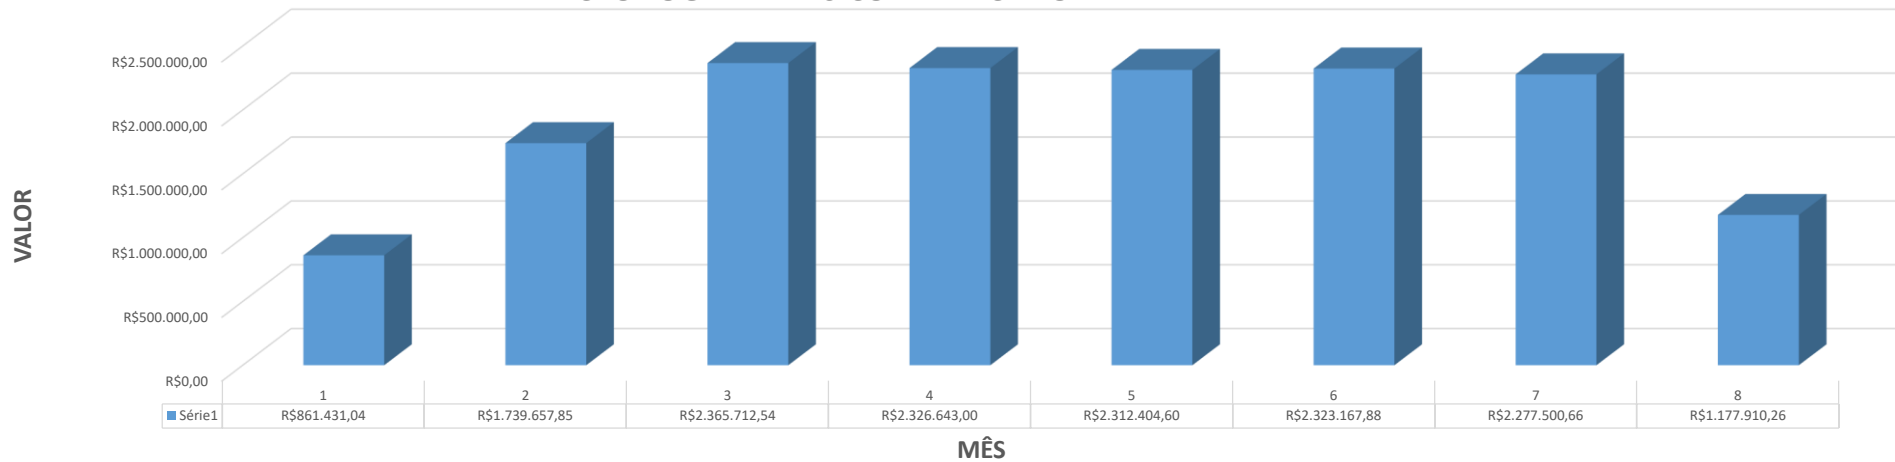

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
 CREA MG - 239787/D
