



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53
DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS**

MEDIÇÃO Nº: 01

Folha nº:

CONTRATADA: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFUNÇÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM

Data de Emissão: 17/07/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/05/2023 a 17/07/2023

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	Diapenssa n° 11/2023		VALOR CTT/TA: RS 1.690.426,45	Saldo Anterior: RS 1.690.426,45	Esta medição: RS 170.804,52	Saldo: RS 1.519.621,93
			Anterior	No Período				
			QUANTIDADES EXECUTADAS		Acumulado		No Período	Acumulado
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, APTADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA	4,50	0,00	4,50	M2	310,95	1.399,28	1.399,28
1.2	ENCARREGADO DE OBRA	120,00	0,00	20,00	DIA	266,25	5.325,00	5.325,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2,00%	0,00	0,40%	%	1.609.929,95	6.439,72	6.439,72
2	PREPARAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO DE TERRA			0,00				
2.1	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CASCALHO							
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO							
2.3	BASE DE SOLO - S/ TRANSPORTE E CARREGAMENTO (ROLO PÊ DE CARNEIRO, PATROL, PIPA E TRATOR GRADE)							
3	TSD COM CAPA SELANTE							
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO	9.710,00	0,00	-	M2	0,69	0,00	0,00
3.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0	9.710,00	0,00	-	M2	4,28	0,00	0,00
3.3	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI	11,65	0,00	-	TON	4.113,74	0,00	0,00
3.4	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	33,99	0,00	-	TON	5.554,78	0,00	0,00
3.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 1 - SEM FRETE	194,20	0,00	-	TON	78,38	0,00	0,00
3.6	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	97,10	0,00	-	TON	82,64	0,00	0,00
3.7	FORNECIMENTO DE AGREGADO AREIA - COM FRETE	48,55	0,00	-	TON	178,92	0,00	0,00
3.9	TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA 1	69.912,00	0,00	-	TONXKM	0,45	0,00	0,00
3.10	TRANSPORTE AGREGADO -BRITA 0	34.956,00	0,00	-	TONXKM	0,45	0,00	0,00
3.11	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0 (TSD)	9.710,00	0,00	-	M2	0,82	0,00	0,00
3.12	BANHO DILUIDO PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL	9.710,00	0,00	-	M2	0,53	0,00	0,00
3.13	LAVAGEM DE BRITA EM CAMINHÃO	436,95		-	M3	5,95	0,00	0,00

A CARGO DO MUNICÍPIO

Edivan Silva Soares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 142038320-5



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53
DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO		MEDIÇÃO Nº 01		Folha nº.			
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFUNÇÃO DO VALE DO JEQUITINHOMIA - CIM		Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		Data de Emissão: 17/07/2023			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO T3D, MICRO E MEIO FIO E SARJETA		Dispenza n = 11/2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/05/2023 a 17/07/2023			
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	Valor CV/TA: R\$ 1.690.426,45	Saldo Anterior: R\$ 1.690.426,45	Esta medição: R\$ 170.804,52	Saldo: R\$ 1.519.621,93	
							VALORES EXECUTADOS RS
		QUANTIDADES EXECUTADAS					
		Anterior	No Período	UNID.	VALOR UNID.	No Período	Acumulado
3.14	PINTURA DE LIGAÇÃO RE-2C	0,00	0,00	M2	0,53	0,00	0,00
4	EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO CAMADA DUPLA 2.8CM					0,00	0,00
4.1	CARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - MECÂNICA	129,60	0,00	M3	3,11	0,00	0,00
4.2	MICROREVESTIMENTO (CAMADA 1 - 2,0 CM)	4.800,00	0,00	M2	2,47	0,00	0,00
4.3	MICROREVESTIMENTO (CAMADA 2 - 0,8 CM)	4.800,00	0,00	M2	1,90	0,00	0,00
4.4	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	58,32	0,00	T	82,64	0,00	0,00
4.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO PÓ DE PEDRA - SEM FRETE	136,08	0,00	T	66,35	0,00	0,00
4.6	FORNECIMENTO DE FILLER PARA MRAF (CAL HIDRATADA)	97,20	0,00	UNID	22,24	0,00	0,00
4.7	FORNECIMENTO DE EMULÇÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE MRAF (RC-1C-E).	24,00	0,00	T	6.110,28	0,00	0,00
4.8	TRANSPORTE COMERCIAL DE PÓ DE PEDRA.	48.988,80	0,00	TXKM	0,45	0,00	0,00
4.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 0.	20.995,20	0,00	TXKM	0,45	0,00	0,00
4.10	LIMPEZA DE VIA NIVEL 1 - CAMINHÃO PIPA	4.800,00	0,00	M2	1,66	0,00	0,00
4.11	LIMPEZA DE VIA NIVEL 2 - LIMPEZA MANUAL	4.800,00	0,00	M2	2,88	0,00	0,00
5	DRENAGEM SUPERFICIAL		2.068,00			156.030,60	156.030,60
5.1	MEIO-FIO A, EXECUTADO C/EXTRUSORA (MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLDI ESCAVAÇÃO E ACERTO DE FAIXA 0,45M	12648,00	0,00	M	35,98	74.406,64	74.406,64
5.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO TIPO 1 FCK 15MPA LARGURA 30CM ESP.7CM	12648,00	0,00	M	39,47	81.623,96	81.623,96
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					RS 1.609,93	RS 1.609,93
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	3,00%	0,00%	%	1.609,929,95	1.609,93	1.609,93
		TOTAL GERAL				RS 170.804,52	RS 170.804,52

Observação: MEIO FIO E SARJETA FAZENDA DA PONTE	Fator de Reajust	Total s/ reajust.
Contratante:	Engº Responsável Técnico CREA	Total c/reajust.
Assinatura do Prefeito	Assinatura do Responsável	Importa a presente medição em R\$:
		RS\$ 170.804,52



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS EM TSD, MICRO REVESTIMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Contratada: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha.

Processo licitatório: 54/2023

Modalidade dispensa de licitação: 11/2023

Contrato de programa: 46/2023

Valor da obra: R\$1.690.426,45

Ordem de Serviço: 08/2023

Prazo: 31/12/2023

Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos.



IMAGEM 01: Fissuras no pavimento, tipo *couro de jacaré*


Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



IMAGEM 02: A superfície da via apresenta-se lisa e polida por desgaste dos inertes devido ao efeito abrasivo decorrente da ação do tráfego.



IMAGEM 03: Pavimento a ser recapeado



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



IMAGEM 04: Pavimento a ser recapeado



IMAGEM 05: Pavimento a ser recapeado


Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038370-5



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



IMAGEM 06: área que será recapeada em micro revestimento.



IMAGEM 07: Loteamento, terraplanagem, execução de meio fio e pavimentação em TSD


Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5



Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

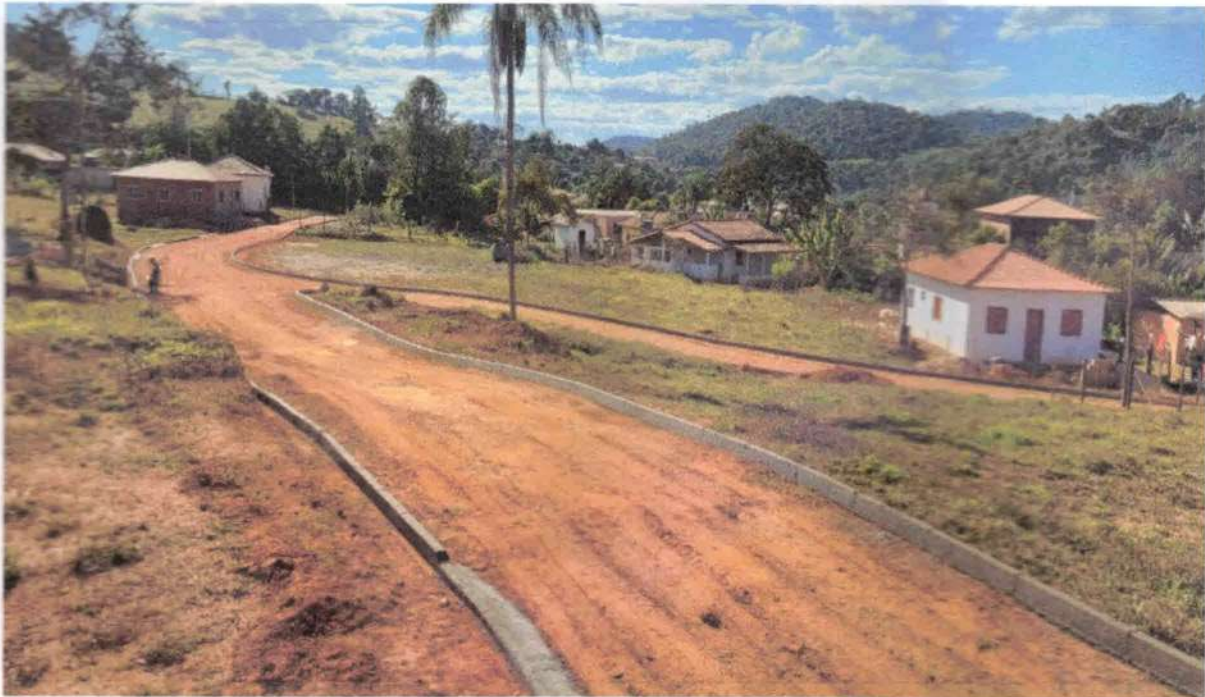


IMAGEM 08: Loteamento, terraplanagem, execução de meio fio e pavimentação em TSD

Edivan Silva Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 142038320-5

EDIVAN SILVA SOARES

Engenheiro Civil CREA/MG-1420383205
